WORK PLAN OF STRENTHENING & MODERNIZATION OF GAZI WIRES LTD

Sl. No.	P.No.	Description of Works	Description of Events
১	কন্সালটেন্ট(ফার্ম)	কন্সালটেন্ট(ফার্ম) নিয়োগ করা	ইওআই প্রক্রিয়ায় প্রকাশ
			ইভেলুয়েশন
			আরএফপি প্রদান,
			ইভেলুয়েশন এন্ড সিলেকসন
			অনুমোদন ও চুক্তি করা
			কার্যাদেশ প্রদান ও কার্য সম্পাদনকাল
			ডিটেলস্ ডুইং তৈরী
			মনিটরিং
২	নির্মাণ প্রতিষ্ঠান	নির্মাণ প্রতিষ্ঠান নিয়োগ	দরপত্র আহবান করা(পত্রিকায় প্রকাশ)
			ইভেলুয়েশন
			অনুমোদন ও চুক্তি করা
			কার্যাদেশ প্রদান
			সম্পাদনকাল
	কারখানা ভবন ও অন্যান্য স্থাপনা :	২ তলা বিশিষ্ট ফ্যাক্টরী বিল্ডিং(ষ্টীল ষ্ট্রাকসার)	সাইট ডেভলাপমেন্ট
			ফাইলিং
			ফাউন্ডেশন
			কলাম এন্ড গ্রুপ ভিম
			রুপ ষ্ট্রাকসার
			রুপ
			সাইট ওয়াল
			উইন্ডো এন্ড ডোর
			ফ্লোর ফিনিশিং
			পেন্টিং
			ইলেকট্রিক ওয়্যারিং
			ফায়ার ফাইটিং এন্ড ইন্সটলেশন
		সাব-ষ্টেশন	ফাউন্ডেশন তৈরী
			বিল্ডিং তৈরী
			ফ্লোর ফিনিশিং
			পেইন্টিং
		বাউন্ডারী ওয়াল ফ্যাক্টরী এলাকা, সিকিউরিটি পোষ্ট,গেইট এবং আরসিসি রোড ড্রেন সহ	পুরাতন বাউন্ডারী ওয়াল উচ্ছেদ
			নতুন বাউন্ডারী ওয়াল তৈরী
			অফিস গেইট তৈরী
			ফ্যাক্টরী গেইট তৈরী
			বাউন্ডারী ওয়াল গেইট ফিনিশিং ও পেইন্টিং
			সিকিউরিটি পোষ্ট তৈরী
			সিকিউরিটি পোষ্ট ফিনিশিং ও পেইন্টিং
			ওয়েস্ট ড্রেন নির্মাণ
			আরসিসি রোড তৈরী
৩	কম্পিউটার	কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ :	কোটেশন আহবান
			আরএফকিউ সিডিউল প্রদান
			ইভেলুয়েশন, অনুমোদন
			কার্যাদেশ প্রদান ও সম্পাদনকাল
৪	উচ্চ সরঞ্জামাদি:	৩৩/১১ কেভি এক্সপ্রেস লাইন (পিডিবি ডিষ্টিবিউশন লাইন)	স্পেসিফিকেশন তৈরী
			দরপত্র আহবান করা(পত্রিকায় প্রকাশ)
			ইভেলুয়েশন
			অনুমোদন ও চুক্তি করা
			কার্যাদেশ প্রদান ও সম্পাদনকাল
			পিডিবির(লোড) অনুমোদন গ্রহন
			রাস্তা খনন (গাওলি হতে পিডিবি সাব-ষ্টেশন
			কেবল সাপ্লাই ও আন্ডারগ্রাউন্ডে কেবল স্থাপন
			খননকৃত রাস্তা ভরাট
			গাজীর সাবষ্টেশনে কেবল নেট-ওয়ার্ক তৈরী
			পিডিবির সংযোগ গ্রহন
			স্পেসিফিকেশন তৈরী
			দরপত্র আহবান করা(পত্রিকায় প্রকাশ)
			ইভেলুয়েশন

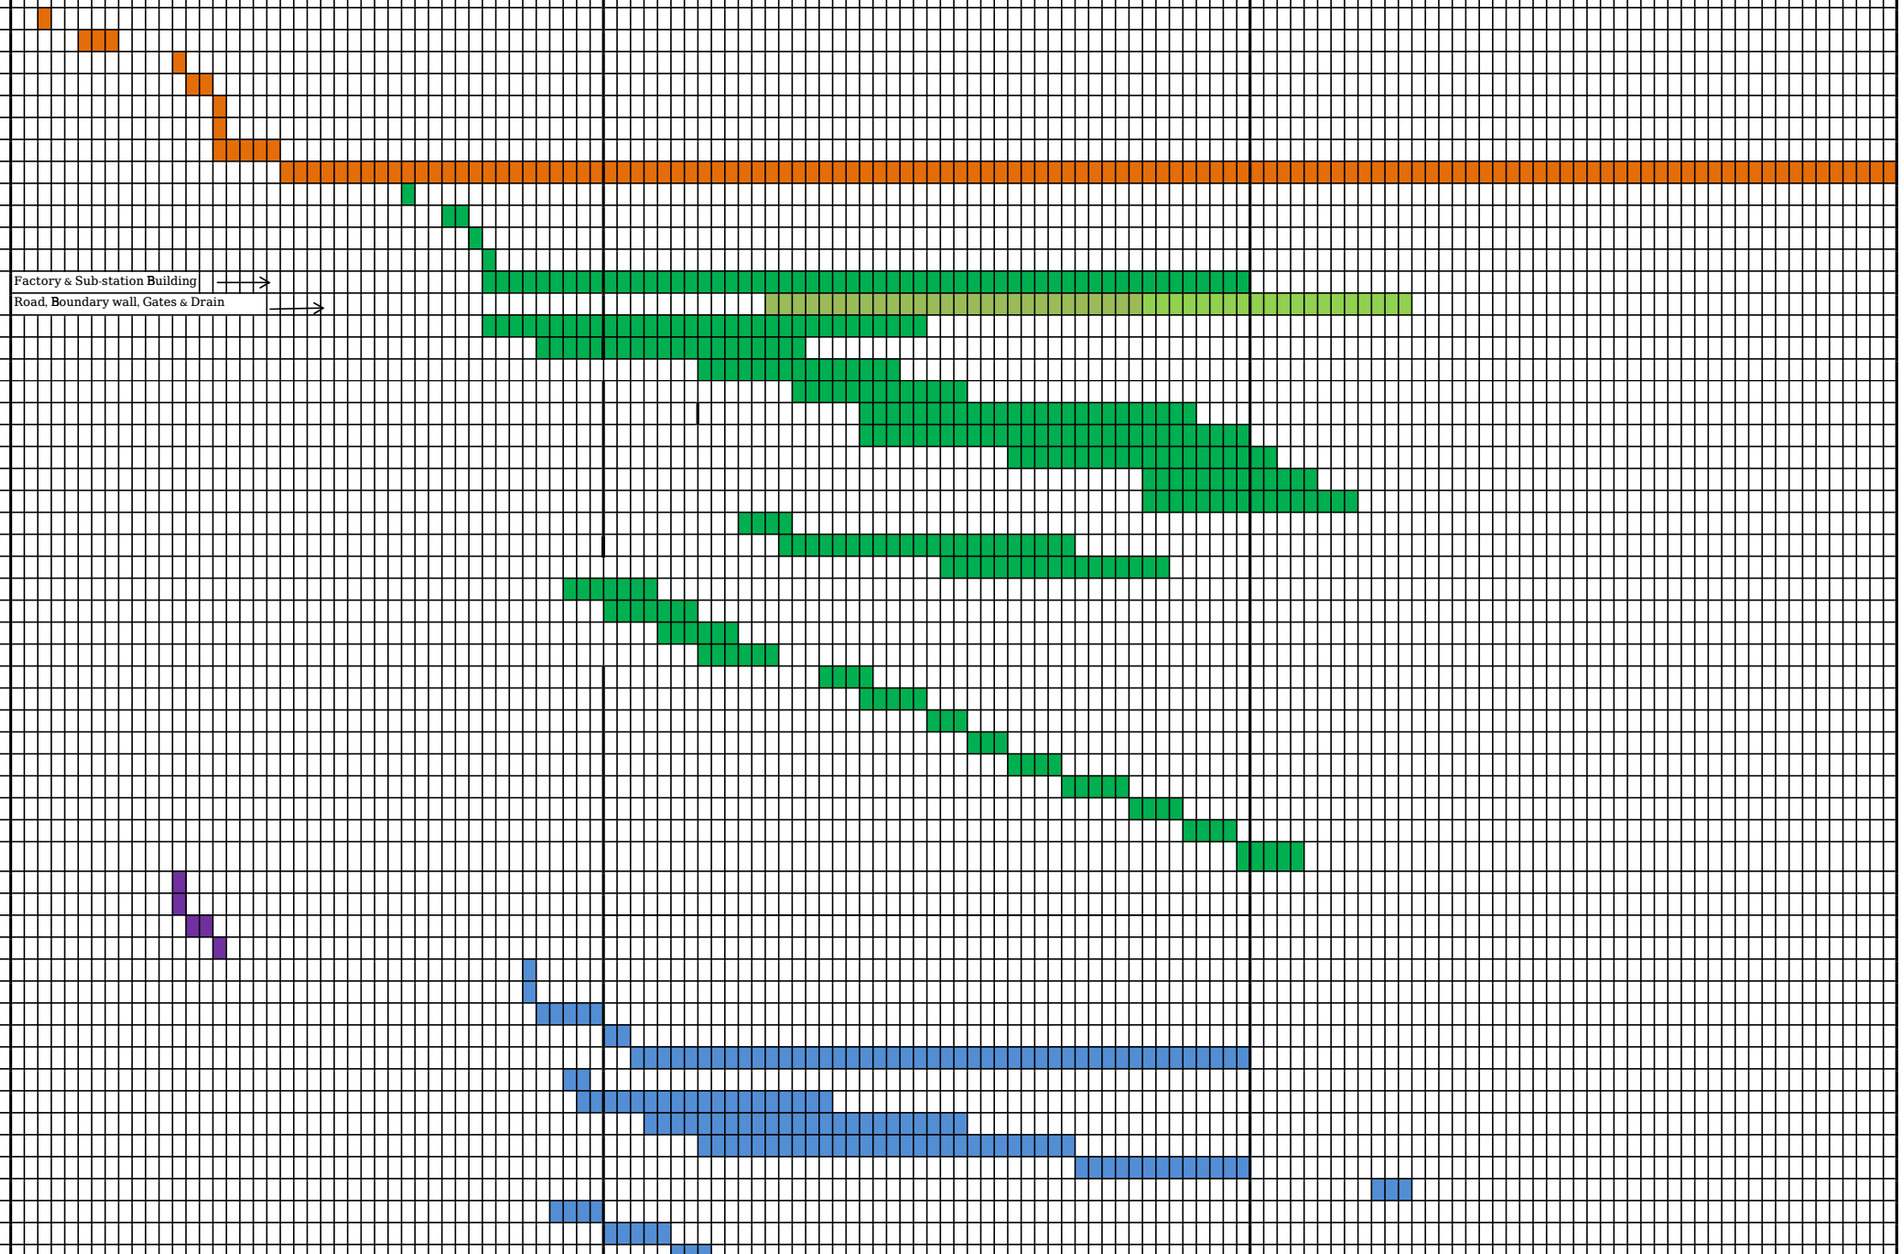

WORK PLAN OF STRENTHENING & MODERNIZATION OF GAZI WIRES LTD

Sl. No.	P.No.	Description of Works	Description of Events
৪	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি	১০০০ কেভিএ সাব-ষ্টেশন	অনুমোদন ও চুক্তি করা
			কার্যাদেশ প্রদান ও সম্পাদনকাল
			HT,LT Panel PFI Plant স্থাপন
			1000 KVA Transformer স্থাপন
			ATS & MDB স্থাপন
			Testing & Commissioning
		ইনভাটার জেনারেটর (অটো-চেঞ্জ অভার)	স্পেসিফিকেশন তৈরী
			দরপত্র আহবান করা(পত্রিকায় প্রকাশ)
			দরপত্র ইভেলুয়েশন এবং অনুমোদন
			চুক্তি করা
			কার্যাদেশ প্রদান
			এলসি ওপেন
			ডকুমেন্ট হস্তান্তর
			জেনারেটর রিসিভ
			জেনারেটর ইন্সটলেশন
			ট্রায়াল রান
			কমারসিয়াল রান
৫	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি (প্যাকেজ-১)	এনামেলিং মেশিন-২টি,ড্রইং মেশিন-২টি এবং প্লাষ্টিক ইনজেকশন মোল্ডিং মেশিন-১টি	স্পেসিপিকেশন তৈরী,
			দরপত্র আহবান করা
			ইভেলুয়েশন ও অনুমোদন
			চুক্তি করা
			কার্যাদেশ প্রদান
			এলসি ওপেন
			বিদেশে প্রি-ইন্সিপেকশন
			মেশিনারীজ রিসিভ
			লে-আউট তৈরী
			মেশিন ফাউন্ডেশন তৈরী
			মেশিন ইরেকশন
			টেস্ট এন্ড ট্রায়াল
			ট্রেনিং
			কমারসিয়াল রান
৬	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি (প্যাকেজ-২)	এনামেলিং মেশিন-১টি,ড্রইং মেশিন-১টি,এয়ার কম্প্রেসর-১টি,বাট ওয়েল্ডিং মেশিন -২টি	স্পেসিপিকেশন তৈরী,
			দরপত্র আহবান করা
			ইভেলুয়েশন ও অনুমোদন
			চুক্তি করা
			কার্যাদেশ প্রদান
			এলসি ওপেন
			বিদেশে প্রি-ইন্সিপেকশন
			মেশিনারীজ রিসিভ
			লে-আউট তৈরী
			মেশিন ফাউন্ডেশন তৈরী
			মেশিন ইরেকশন
			টেস্ট এন্ড ট্রায়াল
			ট্রেনিং
			কমারসিয়াল রান
৭		প্রকল্প সমাপ্ত	

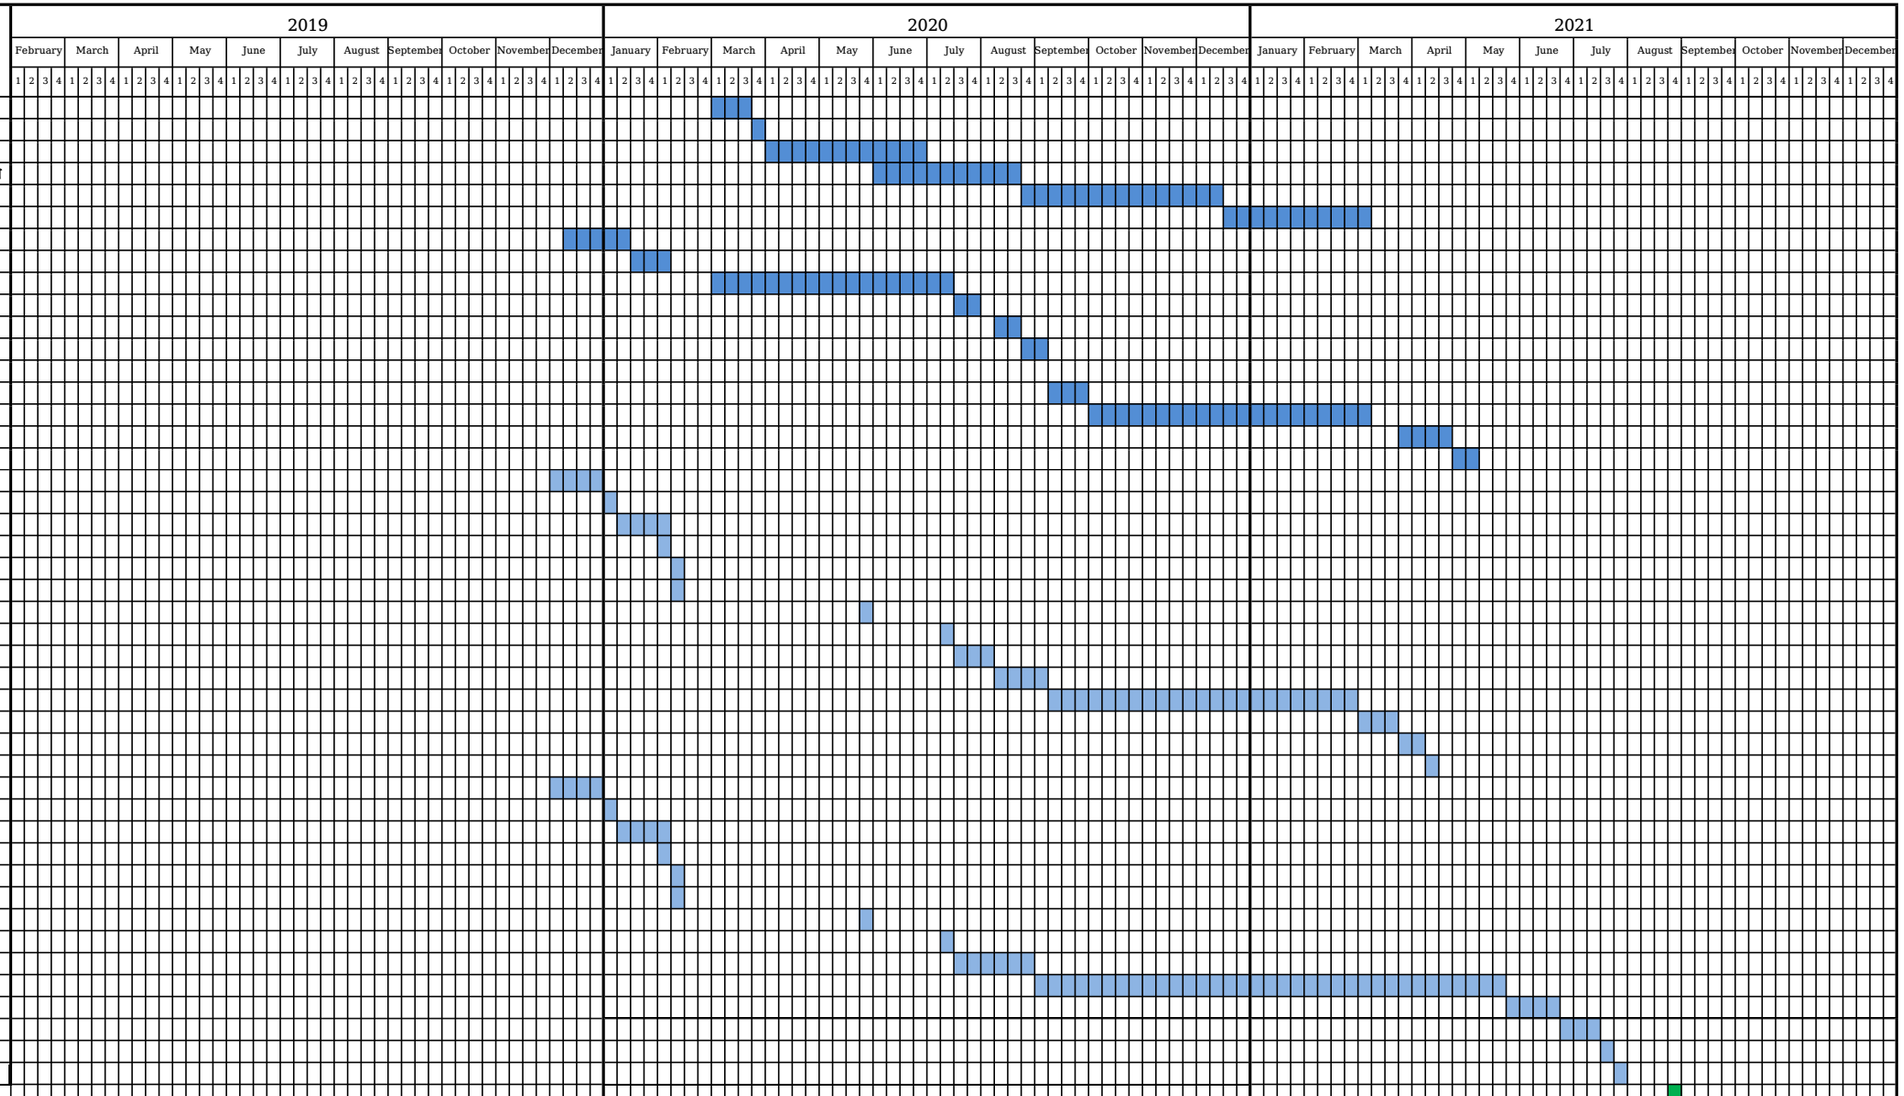

(মো:তাজুল ইসলাম)
উপ-প্রকল্প পরিচালক
গাজী ওয়ারস্ লি:কে শক্তিশালী ও আধুনিকীকরণ শীর্ষক প্রকল্প

(মো:আক্তার হোসেন)
প্রকল্প পরিচালক
গাজী ওয়ারস্ লি:কে শক্তিশালী ও আধুনিকীকরণ শীর্ষক প্রকল্প
